



ประกาศฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ที่ อสฟ. ๓๔ / ๒๕๖๗

เรื่อง เปิดการใช้งานระบบรายงานผลความก้าวหน้าของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และ
รายงานสถานภาพการชำระเงินค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า กฟผ.

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ที่ยังไม่ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)

ตามที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๗๓ สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ และ โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ซึ่งตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระบุว่า ก่อนเริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้า SPP จะต้องรายงานและจัดส่งแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้ กฟผ. และหลังจากนั้นให้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการก่อสร้างรายไตรมาสให้ กฟผ. ทราบภายใน ๑๕ วัน หลังสิ้นไตรมาสใดๆ จนถึงวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) โดยจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) สรุปความก้าวหน้าโครงการโรงไฟฟ้า ระบบส่งเชื่อมต่อ และระบุสัดส่วนของความก้าวหน้าในรูปร้อยละ (๒) จัดทำความก้าวหน้าโครงการ ในรูปแบบ S-Curve (๓) แจ้งปัญหาอุปสรรคของโครงการและแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี) และ (๔) รายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญ นอกจากนี้ SPP ก่อน COD ในฐานะผู้ขอเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับ กฟผ. มีหน้าที่ที่จะต้องชำระเงินค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ตามจำนวนเงิน และภายในเวลาที่ กฟผ. แจ้งกำหนดเรียกเก็บ นั้น

เพื่อให้การนำส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และการตรวจสอบติดตามกำหนดการชำระเงินค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า กฟผ. เป็นไปอย่างมีระบบ และสะดวกต่อการดำเนินการของ กฟผ. และ SPP ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กฟผ. จึงขอเปิดการใช้งานระบบรายงานผลความก้าวหน้าของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และรายงานสถานภาพการชำระเงินค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. กับ SPP ก่อน COD ผ่านเว็บไซต์ <http://www.spp.egat.co.th/progressreport> เป็นช่องทางหลักในการดำเนินการดังกล่าว โดย SPP สามารถศึกษาวิธีการใช้งาน และขั้นตอนการขอใช้บริการ ได้จากคู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(นายเผด็จ เสริมพานิชย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

SPP Progress Report Website

User Guide

What is website?

SPP Progress Report Website เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ SPP สามารถ รายงานผลความก้าวหน้าของการก่อสร้างรายไตรมาส ของ SPP ให้ EGAT ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง EGAT กับ SPP ตามระเบียบและประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ และเพื่อ ติดตามสถานะการดำเนินการชำระเงินค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของ SPP ให้ EGAT ตามเงื่อนไขการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความเร็วในการทำงานระหว่าง EGAT และ SPP มากขึ้น

ในการใช้งานเว็บไซต์ SPP จะต้องแจ้งขอรับสิทธิการใช้งาน โดยทำเป็นหนังสือมอบหมายเพื่อให้ EGAT ทราบ ซึ่ง แต่ละโครงการจะได้รับสิทธิผู้ใช้งาน (User) ตามที่ระบุในหนังสือ ทั้งนี้ บริษัทที่มี SPP หลายโครงการ สามารถมอบหมาย User หนึ่งๆ เพื่อใช้งานหลายโครงการได้


SPP Progress Report Website

Quarterly Progress
Report

ติดตามสถานะการชำระ
ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า

Outline

Part I : Website



User Guide - SPP Progress Report Website

4

Part II: การจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการ

User Guide - SPP Progress Report Website

15

Part III: S-Curve (Excel Online)

User Guide - SPP Progress Report Website

26

Part IV: การมอบสิทธิการใช้งาน

กรณีมอบหมายผู้ดำเนินการแทนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

User Guide - SPP Progress Report Website

30

Part I : Website

 <http://www.spp.egat.co.th/progressreport/>



Homepage

1. **กล่องลงชื่อเข้าใช้งาน**
(สำหรับ User ที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว)
2. **ลิงค์ลงทะเบียนเข้าใช้งาน**
(สำหรับ User ใหม่)
3. **ลิงค์คู่มือการใช้งาน**
4. **ลิงค์ตัวอย่างเอกสารที่ใช้งาน**
 - 1) **ต้นแบบหนังสือมอบหมาย**
(สำหรับ SPP มอบหมายให้ User ใหม่)
 - 2) **ต้นแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ**

SPP Progress Report

กรุณายืนยันตัวตนบุคคลผู้ใช้งาน

รหัสผู้ใช้:

รหัสผ่าน:


[[ลงทะเบียนผู้ใช้งาน SPP และ กฟผ.](#)]
ลิ้งรหัสผ่าน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

Download [คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน](#)
Download ตัวอย่างเอกสารที่ใช้งาน
[หนังสือมอบหมาย](#) | [รายงานโครงการ](#)

[จัดทำโดย: กจสส-ส./อสฟ./กฟผ.]
ผู้ดูแลระบบ: พิทยุตม์ 024362818

How to Register

1. ระบุ Email Address เพื่อกำหนดให้เป็น Username
2. คลิก “ขอรหัสลงทะเบียน”
3. รับรหัสลงทะเบียน ซึ่งระบบจะนำส่งไปที่ Email Address ตามข้อ 1. แล้วนำมากรอกลงในฟอร์ม
4. กรอกชื่อ – นามสกุล ของ User
5. กรอกสังกัดของ User
6. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของ User
7. แนบสำเนาหนังสือมอบอำนาจฉบับสมบูรณ์
8. คลิกอ่านคำประกาศ
9. คลิกลงทะเบียน



SPP Progress Report

[ลงทะเบียนผู้ใช้งาน]

รหัสผู้ใช้ (โปรดระบุ Email Address ยกเว้น กฟผ. ใช้เลขประจำตัว)
1 putt.piromjit@gmail.com

รหัสลงทะเบียน (คุณจะได้รับทาง Email ข้างต้น เมื่อคลิก ขอรหัสฯ)
3 293956 ขอรหัสลงทะเบียน 2

ชื่อ-นามสกุล
4 Pittayut Piromjit

สังกัดหน่วยงาน (บริษัทหรือกลุ่มบริษัท ยกเว้น กฟผ. ใช้ชื่อย่อฝ่าย)
5 Test

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่)
6 0939363974

หนังสือ หรือหลักฐานการมอบหมายจากหน่วยงาน (โปรดเลือกไฟล์)
7 Choose file FORM-LetterOfAttorney-ทดสอบ.pdf

ข้อจำกัดขนาดไฟล์ไม่เกิน 25 MB


8 [โปรดอ่านคำประกาศ](#)

9 ลงทะเบียน

Successful Verification

ระบบจะยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนของ User โดยส่งกลับไป
ยัง Email Address ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. รหัสผู้ใช้งาน (Username)
2. รหัสผ่าน (Password) ที่กำหนดจากระบบโดยตรง
กรณี User ลืมรหัสผ่าน สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบ
(Admin) เพื่อขอรหัสผ่านใหม่
3. สิทธิ์การใช้งาน โดยกำหนดให้ User ได้รับสิทธิ์เข้าใช้
งานโครงการ SPP ตามที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจ

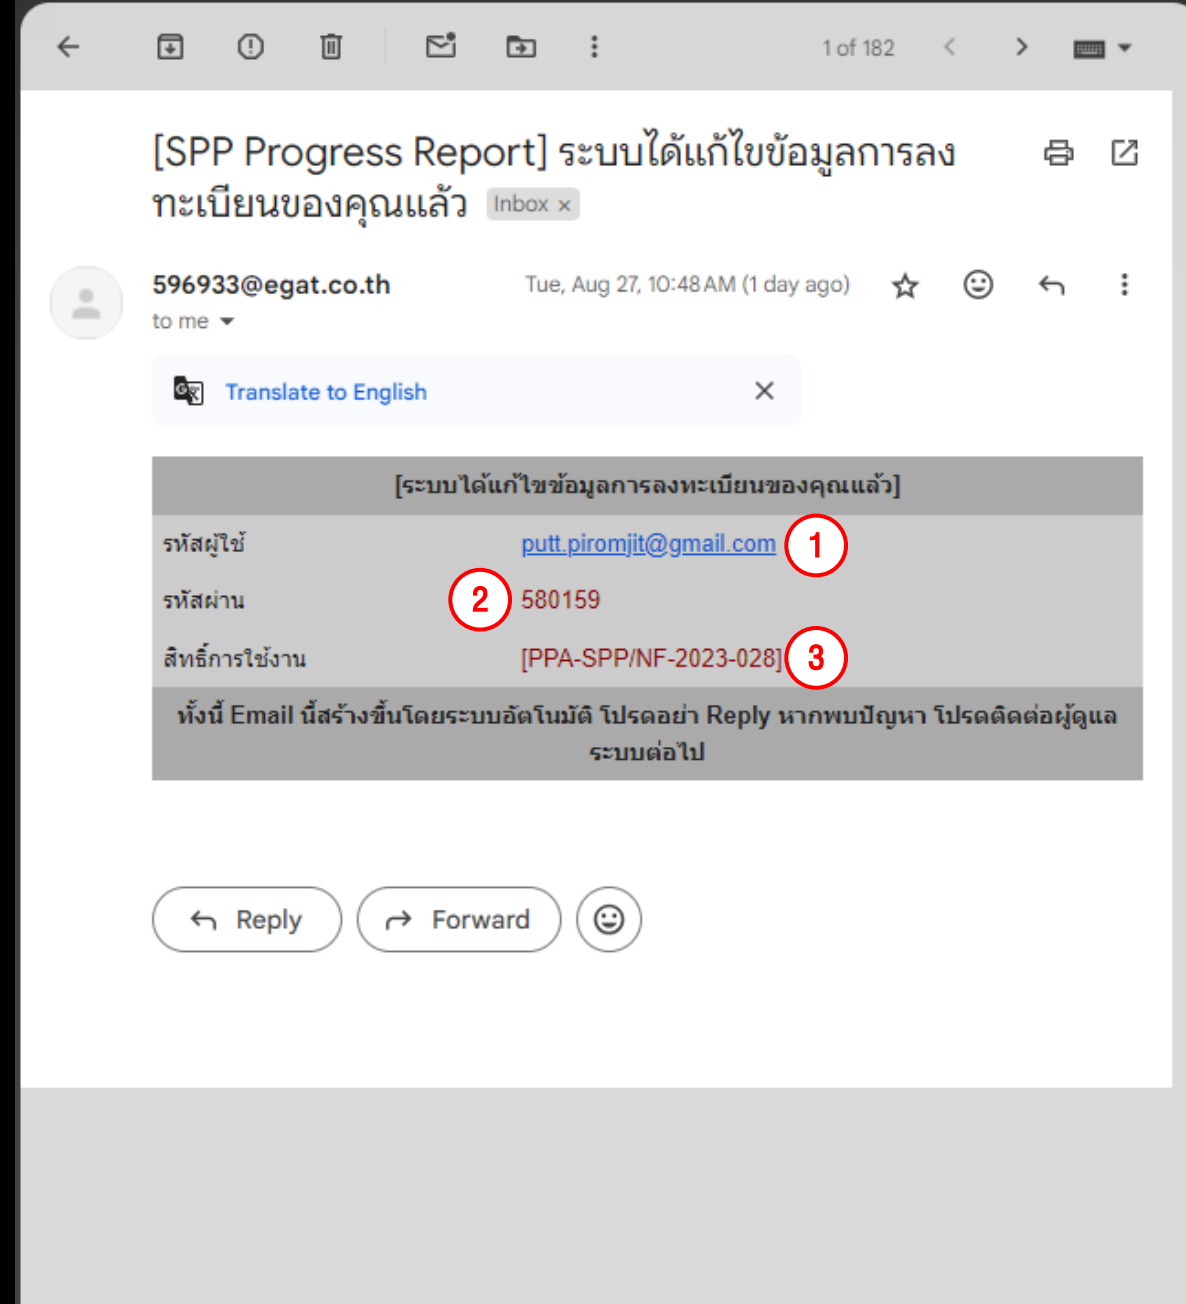

เข้าสู่ระบบ (Log-in)

1. กรอกรหัสผู้ใช้
2. กรอกรหัสผ่าน (ได้รับผ่าน Email Address)
3. คลิก “เข้าสู่ระบบ”

SPP Progress Report

กรุณายืนยันตัวตนบุคคลผู้ใช้งาน

รหัสผู้ใช้: 1

รหัสผ่าน: 2

3

[ลงทะเบียนผู้ใช้งาน SPP และ กฟผ.]
ลิ้งรหัสผ่าน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

Download [คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน](#)
Download ตัวอย่างเอกสารที่ใช้งาน
[หนังสือมอบหมาย](#) | [รายงานโครงการ](#)

[จัดทำโดย: กจสส-ส./อสฟ./กฟผ.]
ผู้ดูแลระบบ: พิทยุตม์ 024362818

รายการหลัก (Main Menu)

1. ประชาสัมพันธ์
สำหรับ EGAT ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SPP
2. ค้นหารายงาน
สำหรับ SPP ค้นหารายงานฯ ฉบับปัจจุบันที่ได้นำเสนอ กฟผ. แล้ว และฉบับก่อนหน้าทั้งหมด พร้อมสรุปข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของ SPP
3. นำส่งรายงาน
สำหรับ SPP นำส่งรายงานฯ
4. เปิด S-Curve
สำหรับ SPP ปรับปรุงข้อมูลความก้าวหน้าโครงการในรูปแบบ S-Curve เพื่อรวบรวมในรายงานฯ
5. ข้อมูลโครงการ
สำหรับ SPP ดูข้อมูลต่างๆ ของโครงการ และติดตามสถานะการชำระเงินค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโครงการ ให้กับ EGAT
6. จัดการผู้ใช้งาน
สำหรับ User แก้ไขข้อมูลส่วนตัว และแก้ไขรหัสผ่าน
7. ข้อมูลเกี่ยวกับ
แสดงข้อมูลของเว็บไซต์

SPP Progress Report

[รายการหลัก]

- 1 [ประชาสัมพันธ์](#)
- 2 [ค้นหารายงาน](#)
- 3 [นำส่งรายงาน](#)
- 4 [เปิด S-Curve](#)
- 5 [ข้อมูลโครงการ](#)
- 6 [จัดการผู้ใช้งาน](#)
- 7 [ข้อมูลเกี่ยวกับ](#)

การนำส่งรายงาน

1. เลือก “นำส่งรายงาน” จากเมนูหลัก
2. เลือกชื่อโครงการ
3. ระบุไตรมาสที่ต้องการนำส่ง
(ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็นไตรมาสล่าสุด)
4. เลือกไฟล์รายงานที่ต้องการนำส่ง
จากคอมพิวเตอร์
5. ระบุสัดส่วนความก้าวหน้า
6. ระบุกำหนดการที่สำคัญ

SPP Progress Report

[นำส่งรายงาน]

ชื่อนิติบุคคล (SPP) [เลขที่สัญญา]	วันเชื่อมต่อระบบเพื่อรับไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้า (First Energize) [ประมาณการ]
	ลบ
ปี (พ.ศ.)	วันเริ่มต้นขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบของการไฟฟ้า (First Sync.) [ประมาณการ]
2567	ลบ
ไตรมาส	วันทดสอบเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในลักษณะ Trial Run (กฟผ.) (ถ้ามี) [ประมาณการ]
2	ลบ
รายงานผลความก้าวหน้าของการก่อสร้าง/แผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า (โปรดเลือกไฟล์)	วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) (โปรดตรวจเทียบกับ SCOD) [ประมาณการ]
Choose file No file chosen	ลบ
ข้อจำกัดขนาดไฟล์ไม่เกิน 25 MB	คำอธิบาย/สรุปสาระสำคัญ หรือ ปัญหาอุปสรรคของโครงการและแนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
สัดส่วนของความก้าวหน้า ตามแผน (ร้อยละ)	
0.00	
สัดส่วนของความก้าวหน้า ตามจริง (ร้อยละ)	
0.00	
ส่งรายงาน	

NOTE!!! สัดส่วนความก้าวหน้า กำหนดการที่สำคัญ จะต้องสอดคล้องกับไฟล์รายงานที่นำส่ง กฟผ. จะสอบถามกลับไปยัง SPP หากข้อมูลไม่สอดคล้องกัน

วิธีเปิด S-Curve เพื่อเรียกดู/แก้ไข

1. เลือก “เปิด S-Curve” จากเมนูหลัก
2. เลือกชื่อโครงการ
3. ใส่ Email ที่ลงทะเบียน
4. ได้รับ OTP ส่งไปยัง Email ที่ลงทะเบียน
5. ใส่ OTP
6. ดู/แก้ไข S-Curve
(รายละเอียดในหัวข้อ S-Curve)

SPP Progress Report

2

[เปิด S-Curve]

ชื่อนิติบุคคล (SPP) [เลขที่สัญญา]


www.spp.egat.co.th says

Username (สำหรับ SPP) : Login Email ของคุณ
Password (สำหรับ SPP) : OTP ที่ได้จาก Email

OK

A screenshot of the Microsoft Excel download page in Thai. At the top left, there is a red circle with the number '5'. The Microsoft logo is at the top center. Below it, the title 'ดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Excel' is displayed. The main heading is 'ใส่รหัสการตรวจสอบ' (Enter verification code). A message says 'คุณได้รับลิงก์ที่ปลอดภัยไปยัง:' (You received a secure link to:). Below this, the email address 'pittayut.piromjit@gmail.com' is shown, followed by the text 'ส่งอีกครั้ง' (Resend). The file type '.xlsx' is indicated on the right. A paragraph explains that the download link is in the email and provides the email address again. There is a search bar with the placeholder text 'ใส่รหัส' (Enter code) and a magnifying glass icon. Below the search bar is a blue button labeled 'ยืนยัน' (Confirm). At the bottom, there is a checkbox and the text 'ให้ฉันลงชื่อเข้าใช้ต่อไป' (Let me sign in). The footer contains the copyright notice '© 2017 Microsoft' and the link 'Privacy & Cookies'.

3

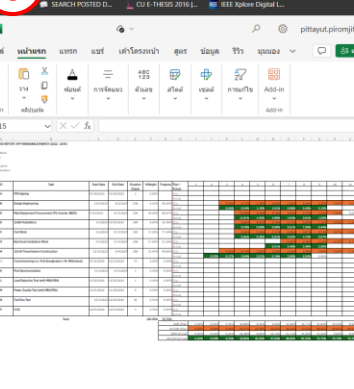

6

mysharepoint.com

SEARCH POSTED D... CU E THE30 2016... REE Xplore Digital L...

pitayut.pitromjit@gmail.com

ไฟล์ การแก้ไข แทรก จัดรูปแบบ เครื่องมือตาราง สูตร ข้อมูล มุมมอง ภาษา การตั้งค่าช่วยเหลือ

ย้อนกลับ ยกเลิก บอกร่างแบบ ตัวเอียง สีตัวอักษร สีพื้นหลัง แทรก ลิงก์ ลิงก์ภายนอก แอปแอดอิน

ค้นหา

CW15

Google Sheets

ID	Title	Duration	Estimate	Actual	Percent Complete
1	Project Initiation	10	10	10	100%
2	Project Planning	20	20	20	100%
3	Project Execution	30	30	30	100%
4	Project Monitoring & Control	10	10	10	100%
5	Project Closure	10	10	10	100%
6	Project Initiation	10	10	10	100%
7	Project Planning	20	20	20	100%
8	Project Execution	30	30	30	100%
9	Project Monitoring & Control	10	10	10	100%
10	Project Closure	10	10	10	100%

ProgressReport S-Curve

ข้อมูลโครงการ

1. เลือกสถานะโครงการ
 - โครงการที่ยังไม่ COD
 - โครงการที่ COD แล้ว
2. แสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมกำหนดชำระเงิน

- สีเขียว = ดำเนินการแล้ว

- สีชมพู = ก่อนถึงกำหนด 60 วัน

- สีแดง = ก่อนถึงกำหนด 50 วัน
3. เครื่องมือเพิ่มเติม
 - ดูเอกสารอ้างอิงชำระเงินได้แก่ หนังสือข้อตกลงฯ / ใบเสร็จรับเงิน (กรณีชำระแล้ว)

SPP Progress Report

[ข้อมูลโครงการ]

[โครงการที่ยังไม่ COD] | [โครงการที่ COD แล้ว (หรือไม่อนุญาตให้จ่าย)]

[ตัวกรองค้นหา :]

เลขที่สัญญา	ชื่อนิติบุคคล (SPP)	สฟ.กฟผ. (ต้นทาง)	ชำระเงิน#1 (บาท) ในวันที่สถานะ	ชำระเงิน#2 (บาท) ในวันที่สถานะ	ชำระเงิน#3 (บาท) ในวันที่สถานะ	ชำระเงิน#4 (บาท) ในวันที่สถานะ	ชำระเงิน#5 (บาท) ในวันที่สถานะ	กำหนดเริ่มซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) สถานะ	S-Curve Address	ความเห็น กฟผ.	หัวหน้าแผนก กฟผ. ผู้ประสานงาน กฟผ.	บันทึกย่อ กฟผ.	ข้อมูล รายละเอียด	เครื่องมือ
			6,000,000.00 31/08/2566 [ชำระแล้ว]	20,533,334.00 31/07/2567 [ชำระแล้ว]	.00 -	.00 -	.00 -	31/12/2567 [อีก 110 วัน]	เปิดลิงก์	-	-	-	เพิ่มเติม	
			6,000,000.00 31/08/2566 [ชำระแล้ว]	.00 -	150,000.00 30/11/2566 [ชำระแล้ว]	.00 -	.00 -							
			6,000,000.00 31/08/2566 [ชำระแล้ว]	.00 -	150,000.00 30/11/2566 [ชำระแล้ว]	.00 -	.00 -							
			6,000,000.00 11/09/2568 [อีก 364 วัน]	.00 -	.00 -	.00 -	.00 -							
			7,600,000.00 11/06/2569 [อีก 637 วัน]	30,000,000.00 11/06/2569 [อีก 637 วัน]	.00 -	.00 -	.00 -							
			17,000,000.00 31/10/2569 [อีก 779 วัน]	27,500,000.00 31/10/2567 [อีก 49 วัน]	.00 -	.00 -	.00 -							
			7,600,000.00 31/10/2570 [อีก 1144 วัน]	10,000,000.00 31/10/2570 [อีก 1144 วัน]	1,250,000.00 31/10/2570 [อีก 1144 วัน]	.00 -	.00 -							
			6,000,000.00 -	.00 -	.00 -	.00 -	.00 -							
			7,600,000.00 31/10/2570 [อีก 1144 วัน]	10,000,000.00 31/10/2570 [อีก 1144 วัน]	1,250,000.00 31/10/2570 [อีก 1144 วัน]	.00 -	.00 -							

2

พบข้อมูลจำนวน : 9 รายการ

[ข้อมูลรายละเอียด]

ชื่อนิติบุคคล (SPP) :
(เลขที่สัญญา :)
สถานีไฟฟ้าแรงสูง (ต้นทาง) :
คำสำคัญระเบียบโครงการ :

เพิ่มเติม

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า-จังหวัด :
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า-อำเภอ :
กำลังผลิตติดตั้ง :
พลังไฟฟ้าตามสัญญา :
ระบบกักเก็บพลังงาน :
ลักษณะการเชื่อมต่อ :
จุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า :
จุดซื้อขายไฟฟ้า :

เอกสารอ้างอิงชำระเงิน

ชำระเงิน#1 : เปิดไฟล์
ชำระเงิน#2 : เปิดไฟล์
ชำระเงิน#3 : -
ชำระเงิน#4 : -
ชำระเงิน#5 : -

ปิดหน้า

จัดการผู้ใช้งาน

เฉพาะกำหนดรหัสผ่านใหม่เท่านั้น
(กรณีต้องการปรับปรุงสิทธิ์การใช้งาน
หรือข้อมูลส่วนตัว โปรดติดต่อ Admin)

SPP Progress Report

[จัดการผู้ใช้งาน]

ชื่อ-นามสกุล

พิทยุตม์ ภิรมย์จิตต์ (User)

สังกัดหน่วยงาน (บริษัทหรือกลุ่มบริษัท ยกเว้น กฟผ. ใช้ชื่อย่อฝ่าย)
อสฟ.

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่)
0939363974

สิทธิ์การใช้งาน (หากต้องการปรับปรุงสิทธิ์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ)

รหัสผ่านใหม่

รหัสผ่านใหม่ (ยืนยัน)

รหัสผ่านเดิม (ระบบกรณีต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านเท่านั้น)

บันทึก

Part II: การจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการ

หน้าปก

1. ระบุชื่อโครงการ (ถ้ามี)
2. ระบุชื่อบริษัท
3. ใส่เลขที่สัญญา/วันที่
4. ระบุปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา
5. ระบุไตรมาส/ปี ของรายงาน
6. ระบุวันนำส่ง กฟผ. โดยต้องเป็นวันเดียวกับที่ Upload ในระบบ
7. ระบุข้อมูลผู้ประสานงาน ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

รายงานผลความก้าวหน้าของการก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้า(ระบุชื่อโครงการ).....

บริษัท

ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ PPA-SPP/...-...-... ลงวันที่ ...

ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา ... เมกะวัตต์

ประจำไตรมาสที่ ... ปี ...

นำส่ง กฟผ. เมื่อวันที่ ...

ผู้ประสานงาน (ตามระบบ กฟผ.) ... โทร. ... email: ...

สารบัญ

เมื่อกรอกข้อมูลในตามหัวข้อต่างๆ แล้ว

ให้ SPP คลิกงวาที่สารบัญ > Update Field >
Update entire table

สารบัญ	
สรุปความก้าวหน้าโครงการโรงไฟฟ้า.....	1
1. การดำเนินการด้านใบอนุญาต.....	1
2. การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม	1
3. การดำเนินการด้านวิศวกรรม (ออกแบบ/ติดตั้ง/ทดสอบ/นำเข้าใช้งาน)	1
4. แผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า (โดยสังเขป).....	1
สรุปความก้าวหน้าระบบส่งเชื่อมต่อ	2
1. การออกแบบ	2
2. การก่อสร้าง	2
3. การทดสอบ.....	2
4. การนำเข้าใช้งาน	2
5. แผนการก่อสร้างระบบส่งเชื่อมต่อ (โดยสังเขป)	2
สัดส่วนความก้าวหน้าประจำไตรมาสที่ ... ปี	3
1. ความก้าวหน้าตามแผนงาน (% Plan)	3
2. ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจริง (% Actual).....	3
ตารางแสดงความก้าวหน้าโครงการ.....	4
ความก้าวหน้าโครงการในรูปแบบ S-Curve.....	5
ปัญหาอุปสรรคของโครงการและแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)	6
ภาพถ่ายโครงการ.....	7
รายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญ.....	8

สรุปความก้าวหน้า โครงการโรงไฟฟ้า

1. การดำเนินการด้านใบอนุญาต
ใส่รายละเอียด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 1. “อยู่ระหว่างดำเนินการ”
 2. “ได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่ ... (ใบอนุญาตเลขที่ ... ออกโดย ...)”
2. การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
ใส่รายละเอียด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 1. “อยู่ระหว่างดำเนินการ”
 2. “กกพ. เห็นชอบเมื่อวันที่ ...”
 3. “สพ. เห็นชอบเมื่อวันที่ ... (กรณี EIA/EHIA)”
3. การดำเนินการด้านวิศวกรรม อธิบายพอสังเขป
4. แผนการก่อสร้าง (โดยสังเขป)
ระบุเป็นวันที่ หรือ ตั้งแต่วันที่ ... ถึง ...

สรุปความก้าวหน้าโครงการโรงไฟฟ้า

1. การดำเนินการด้านใบอนุญาต

ชนิดใบอนุญาต	รายละเอียด
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1)	
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)	
ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า	
ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคู่	

2. การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

ชนิดรายงาน	รายละเอียด
รายงานการศึกษาหรือการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน	
รายงานประมวลผลหลักการปฏิบัติ (CoP)	
EIA / EHIA (ถ้ามี)	

3. การดำเนินการด้านวิศวกรรม (ออกแบบ/ติดตั้ง/ทดสอบ/นำเข้าใช้งาน)

4. แผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า (โดยสังเขป)

รายละเอียด	กำหนดการ
กำหนดการเริ่มก่อสร้าง	
กำหนดวันรับไฟฟ้าเพื่อทำการทดสอบครั้งแรก (First Energization Date)	
กำหนดวันเริ่มต้นขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบ ของการไฟฟ้า (First Synchronization Date)	
กำหนดวันทดสอบเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในลักษณะ Trial Run (กรณีประเภทสัญญา Partial-Firm)	
กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD)	

สรุปความก้าวหน้า ระบบส่งเชื่อมต่อ

1. การออกแบบ/ก่อสร้าง/ทดสอบ/นำเข้าใช้งาน
ให้อธิบายพอสังเขป
2. แผนการก่อสร้าง (โดยสังเขป)
ระบุหัวข้อที่สำคัญ และ
กำหนดการระบุเป็นวันที่ หรือ ตั้งแต่วันที่ ... ถึง ...

สรุปความก้าวหน้าระบบส่งเชื่อมต่อ

1. การออกแบบ

2. การก่อสร้าง

3. การทดสอบ

4. การนำเข้าใช้งาน

5. แผนการก่อสร้างระบบส่งเชื่อมต่อ (โดยสังเขป)

รายละเอียด	กำหนดการ

สัดส่วนความก้าวหน้า ประจำไตรมาส

ระบุเป็น %สะสม ของความก้าวหน้าตามแผนงาน
และที่เกิดขึ้นจริง

สัดส่วนความก้าวหน้าประจำไตรมาสที่ ... ปี ...

1. ความก้าวหน้าตามแผนงาน (% Plan)
ร้อยละ _____

2. ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจริง (% Actual)
ร้อยละ _____

- 3 -

ตารางแสดง ความก้าวหน้าโครงการ

แทรก Gantt Chart จาก Excel Online ของ
โครงการ โดยแปลงเป็น PDF / JPEG / PNG



ความก้าวหน้าโครงการ ในรูปแบบ S-Curve

แทรก S-Curve จาก Excel Online ของ
โครงการ โดยแปลงเป็น PDF / JPEG / PNG

ความก้าวหน้าโครงการในรูปแบบ S-Curve



แทรก PDF S-Curve จาก Excel

- 5 -

ปัญหาอุปสรรคของโครงการ และแนวทางการแก้ไข

อธิบายปัญหาและแนวทางแก้ไขเป็นรายชื่อ
ตามตัวอย่าง

ปัญหาอุปสรรคของโครงการและแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

ปัญหา #1 :

แนวทางการแก้ไข

ปัญหา #2 :

แนวทางการแก้ไข


ปัญหา #3 :

แนวทางการแก้ไข

- 6 -


ภาพถ่ายโครงการ

แทรกภาพถ่ายโครงการ โดยใช้รูปแบบ JPEG /
PNG โดยอิสระ

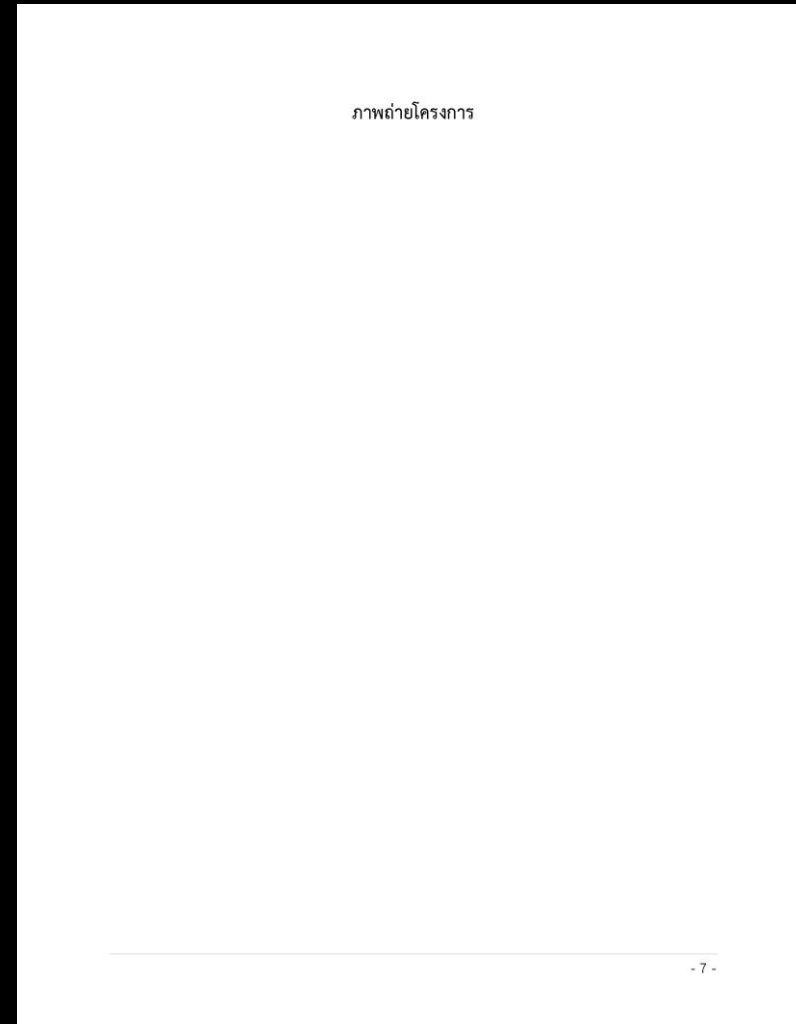

รายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญ

อธิบายพอสังเขป

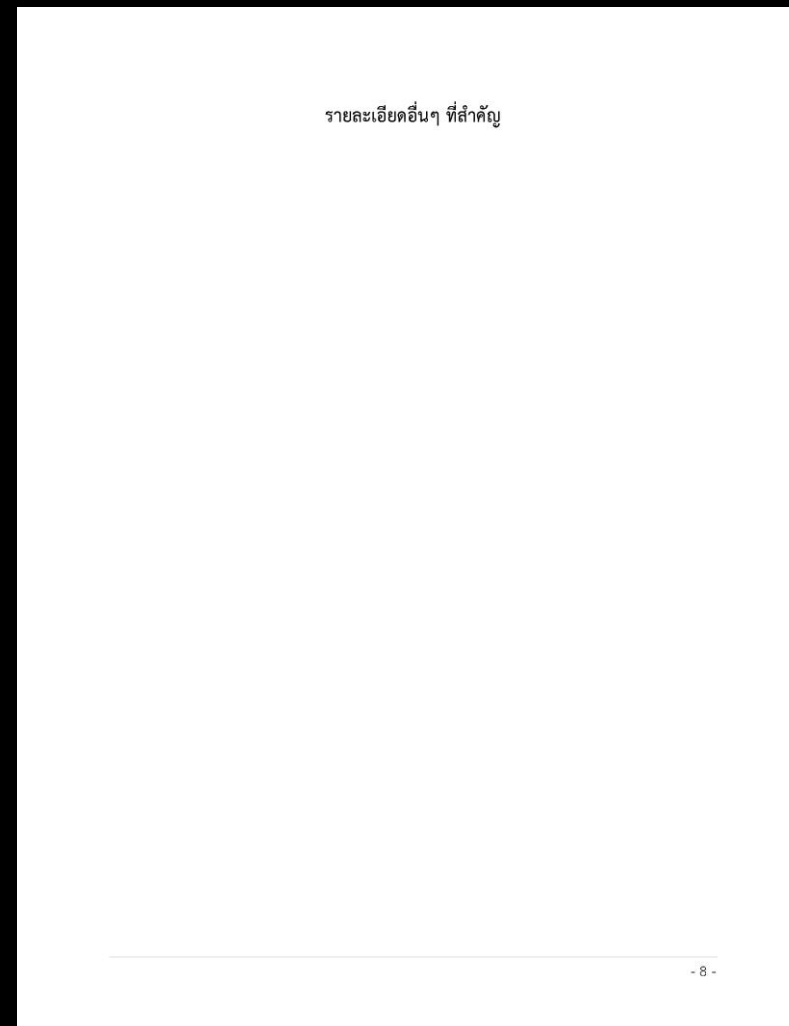

Part III: S-Curve (Excel Online)

ส่วนประกอบ Gantt Chart

PROGRESS REPORT: SPP RENEWABLE ENERGY (2022 - 2030)

PPA-ID

Project Name

PPA Type

SOURCE

Plant Location

EGAT Substation

SCOD

ID	Task	Start Date (dd/mm/yyyy)	End Date (dd/mm/yyyy)	Duration (Days)	%Weight	Progress (Per Task)	Plan / Actual	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A	PPA Signing			1	0.00%	#DIV/0! (0%)	Plan Actual																
B	Design Engineering			238	4.50%	95.33% (4.29%)	Plan Actual			0.38% 0.04%	0.73% 0.54%	1.48% 1.19%	0.85% 1.01%	0.28% 0.98%	0.44% 0.43%	0.28% 0.10%	0.05% 1.54%	0.02% 1.84%					
D	Main Equipment Procurement (PV, Inverter, BESS)			294	34.00%	88.47% (30.08%)	Plan Actual				11.69% 11.81%	4.39% 4.33%	4.78% 4.68%	4.63% 4.64%	3.74% 3.61%	1.54% 1.02%	1.84% 0.92%	0.00% 1.34%	0.00% 0.39%	1.17% 0.24%	0.21%		
E	115kV Substation			171	8.00%	55.38% (4.43%)	Plan Actual				0.65% 0.53%	0.81% 0.68%	0.79% 0.99%	0.77% 0.51%	0.98% 1.28%	1.12% 0.44%	0.92% 1.28%	1.34% 0.44%	0.39% 0.44%	0.24% 0.44%			
F	Civil Work			302	17.00%	77.41% (13.16%)	Plan Actual				0.85% 0.85%	0.38% 0.38%	1.17% 0.91%	2.35% 3.02%	3.07% 4.13%	3.71% 3.87%	3.27% 5.13%	0.87% 3.11%	0.72% 1.72%	0.52% 0.36%	0.08% 0.04%		
G	Electrical Installation Work			9	17.00%	51.18% (8.7%)	Plan Actual							0.93% 0.01%	2.18% 0.49%	3.54% 2.40%	5.13% 5.80%	3.11% 5.80%	1.72% 5.80%	0.36% 5.80%	0.04% 5.80%		
H	115 kV Transmission Construction			268	15.00%	80.60% (12.09%)	Plan Actual			0.03% 0.17%	0.74% 2.64%	1.29% 2.01%	1.93% 5.14%	2.34% 2.06%	2.36% 0.04%	1.64% 0.00%	2.00% 0.00%	1.49% 0.00%	1.18% 0.00%				
J	Commissioning (i.e. First Energization / AC Withstand)			70	2.00%	0.00% (0%)	Plan Actual													0.40% 0.40%	0.60% 0.60%	1.00% 1.00%	
K	First Synchronization			1	0.50%	0.00% (0%)	Plan Actual														0.50% 0.50%		
L	Load Rejection Test (with MEA/PEA)			1	0.50%	0.00% (0%)	Plan Actual														0.50% 0.50%		
M	Power Quality Test (with MEA/PEA)			8	0.50%	0.00% (0%)	Plan Actual														0.50% 0.50%		
N	Trial Run Test			30	0.50%	0.00% (0%)	Plan Actual															0.50% 0.50%	
P	COD			1	0.50%	0.00% (0%)	Plan Actual															0.50% 0.50%	
Total					100.00%	72.75%																	
								SUM (Plan)	0.00%	0.00%	0.41%	14.66%	8.35%	9.52%	11.30%	12.77%	11.83%	13.21%	6.82%	4.01%	2.69%	2.43%	2.00%
								ACCUM (Plan)	0.00%	0.00%	0.41%	15.07%	23.43%	32.94%	44.24%	57.01%	68.85%	82.05%	88.87%	92.88%	95.57%	98.00%	100.00%
								SUM (Actual)	0.00%	0.03%	0.21%	16.36%	8.60%	12.74%	11.71%	11.88%	11.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
								ACCUM (Actual)	0.00%	0.03%	0.24%	16.60%	25.20%	37.94%	49.65%	61.53%	72.75%	72.75%	72.75%	72.75%	72.75%	72.75%	72.75%

1. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ (Default)

2. กิจกรรม (Task)

3. วันเริ่มต้น / วันสิ้นสุด (dd/mm/yyyy)
4. ระยะเวลา (วัน)

5. น้ำหนักของแต่ละกิจกรรม (%) (รวมทุกกิจกรรมเป็น 100%)

6. ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) (ความก้าวหน้าเทียบน้ำหนัก (%))
7. Gantt Chart

8. สรุปผลรวมความก้าวหน้า

การใส่ข้อมูล Gantt Chart

สำหรับหัวข้อหมายเลข 7

แถว Plan

เป็นการกระจายแผนงานตาม
%Weight ให้แต่ละเดือน

แถว Actual

เป็นการกระจายงานที่เกิดขึ้นจริง
เทียบกับแผน

PROGRESS REPORT: SPP RENEWABLE ENERGY (2022 - 2030)

PPA-ID

Project Name

PPA Type

SOURCE

Plant Location

EGAT Substation

SCOD


ID	Task	Start Date (dd/mm/yyyy)	End Date (dd/mm/yyyy)	Duration (Days)	%Weight	Progress (Per Task)	Plan / Actual	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A	PPA Signing			1	0.00%	#DIV/0! (0%)	Plan Actual																
B	Design Engineering			238	4.50%	95.33% (4.29%)	Plan Actual			0.38% 0.04%	0.73% 0.54%	1.48% 1.19%	0.85% 1.01%	0.28% 0.98%	0.44% 0.43%	0.28% 0.10%	0.05% 0.05%	0.02% 0.02%					
D	Main Equipment Procurement (PV, Inverter, BESS)			294	34.00%	88.47% (30.08%)	Plan Actual				11.69% 11.81%	4.39% 4.33%	4.78% 4.68%	4.63% 4.64%	3.74% 3.61%	1.54% 1.02%	1.84% 0.92%	0.00% 1.34%	0.00% 0.39%	1.17% 0.24%	0.21% 0.00%		
E	115kV Substation			171	8.00%	55.38% (4.43%)	Plan Actual				0.65% 0.53%	0.81% 0.68%	0.79% 0.99%	0.77% 0.51%	0.98% 1.28%	1.12% 0.44%	0.92% 0.00%	1.34% 0.00%	0.39% 0.00%	0.24% 0.00%			
F	Civil Work			302	17.00%	77.41% (13.16%)	Plan Actual				0.85% 0.85%	0.38% 0.38%	1.17% 0.91%	2.35% 3.02%	3.07% 4.13%	3.71% 3.87%	3.27% 0.00%	0.87% 0.00%	0.72% 0.00%	0.52% 0.00%	0.08% 0.00%		
G	Electrical Installation Work			9	17.00%	51.18% (8.7%)	Plan Actual							0.93% 0.01%	2.18% 0.49%	3.54% 2.40%	5.13% 5.80%	3.11% 0.00%	1.72% 0.00%	0.36% 0.00%	0.04% 0.00%		
H	115 kV Transmission Construction			268	15.00%	80.60% (12.09%)	Plan Actual			0.03% 0.17%	0.74% 2.64%	1.29% 2.01%	1.93% 5.14%	2.34% 2.06%	2.36% 0.04%	1.64% 0.00%	2.00% 0.00%	1.49% 0.00%	1.18% 0.00%				
J	Commissioning (i.e. First Energization / AC Withstand)			70	2.00%	0.00% (0%)	Plan Actual													0.40% 0.00%	0.60% 0.00%	1.00% 0.00%	
K	First Synchronization			1	0.50%	0.00% (0%)	Plan Actual														0.50% 0.00%		
L	Load Rejection Test (with MEA/PEA)			1	0.50%	0.00% (0%)	Plan Actual														0.50% 0.00%		
M	Power Quality Test (with MEA/PEA)			8	0.50%	0.00% (0%)	Plan Actual														0.50% 0.00%		
N	Trial Run Test			30	0.50%	0.00% (0%)	Plan Actual															0.50% 0.00%	
P	COD			1	0.50%	0.00% (0%)	Plan Actual															0.50% 0.00%	
Total					100.00%	72.75%																	
							SUM (Plan)	0.00%	0.00%	0.41%	14.66%	8.35%	9.52%	11.30%	12.77%	11.83%	13.21%	6.82%	4.01%	2.69%	2.43%	2.00%	
							ACCUM (Plan)	0.00%	0.00%	0.41%	15.07%	23.43%	32.94%	44.24%	57.01%	68.85%	82.05%	88.87%	92.88%	95.57%	98.00%	100.00%	
							SUM (Actual)	0.00%	0.03%	0.21%	16.36%	8.60%	12.74%	11.71%	11.88%	11.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
							ACCUM (Actual)	0.00%	0.03%	0.24%	16.60%	25.20%	37.94%	49.65%	61.53%	72.75%	72.75%	72.75%	72.75%	72.75%	72.75%	72.75%	

1. SPP กรอกเฉพาะข้อมูลในหัวข้อหมายเลข 3 และ 7
2. ข้อมูลในหัวข้อหมายเลข 7 กรอกเฉพาะค่า ไม่ต้องเติมสี เพราะกรณีมีค่ามากกว่า 0 (มีกิจกรรมเกิดขึ้น)
โปรแกรมจะใส่สีให้อัตโนมัติ

Progression Chart (S-Curve)

1. กราฟแสดงความก้าวหน้าสะสมตามแผนงานแต่ละเดือน (สีส้ม)
2. กราฟแสดงความก้าวหน้าสะสมที่เกิดขึ้นจริงแต่ละเดือน (สีเขียว)

NOTE!!! ข้อมูลจะโยงกับ
Gantt Chart ก่อนหน้า
SPP ไม่ต้องแก้ไข
ข้อมูลหน้านี้

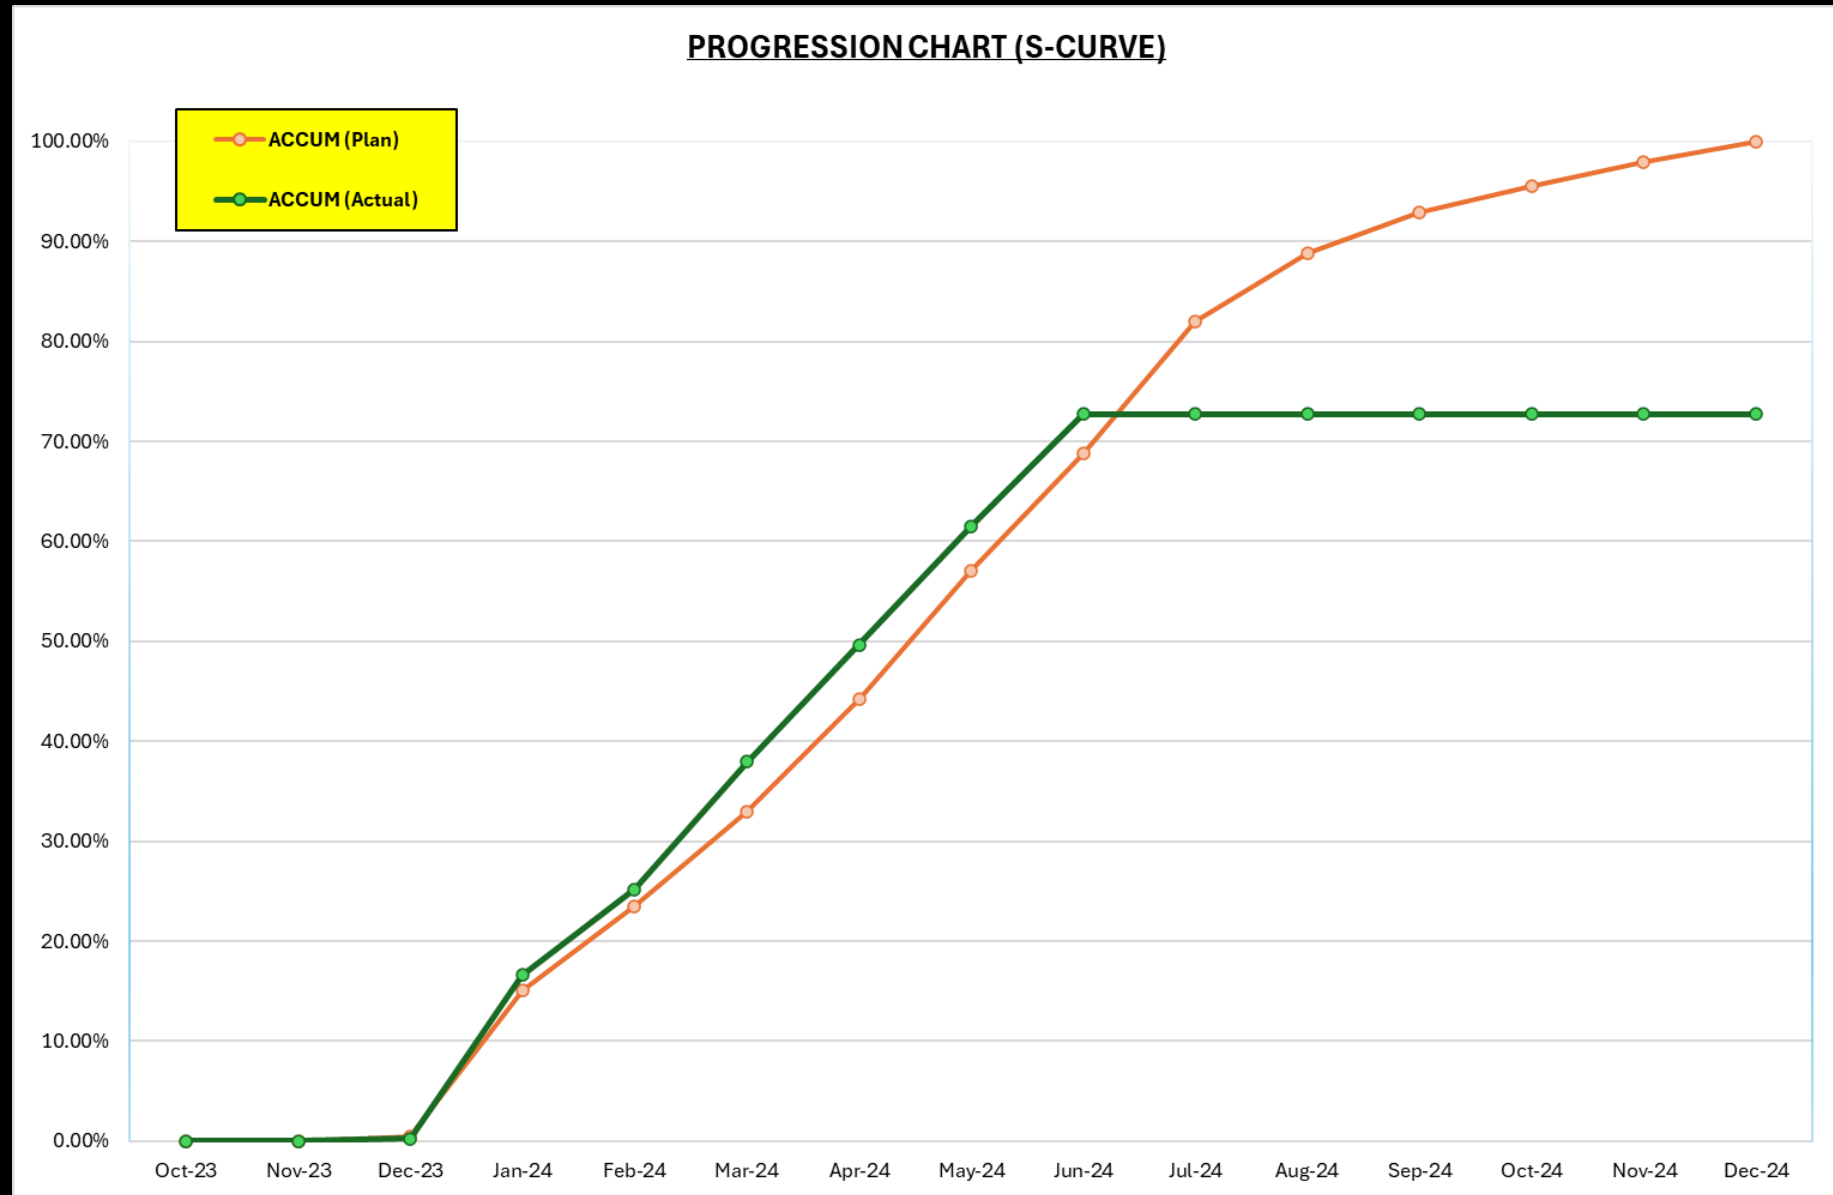

Part IV: การมอบสิทธิการใช้งาน

กรณีมอบหมายผู้ดำเนินการแทนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

หนังสือมอบหมาย

SPP จัดทำหนังสือมอบหมายตามตัวอย่างที่ดาวโหลดจากเว็บไซต์ แล้วส่งกลับมายัง กฟผ. ผ่านช่องทางดังนี้

1. แนบพร้อมผู้ใช้งานสมัครเข้าใช้งานระบบ
2. ส่งเข้า งานสารบรรณ กฟผ.
สำนักงานกลาง กฟผ. 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์
ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ. นนทบุรี

NOTE!!! หากผู้สมัครเข้าใช้งานระบบมีรายชื่อไม่ตรงตามหนังสือมอบหมาย กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าใช้งานระบบ

ที่ ...

..... ตุลาคม 2567

เรื่อง มอบหมายเข้าใช้งานระบบรายงานผลความก้าวหน้าของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และรายงานสถานภาพการชำระเงินค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของบริษัท ... จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อ้างถึง 1. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ ... ลงวันที่ ...

2. ประกาศฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ อสฟ. .../2567 เรื่อง ประกาศใช้งานระบบรายงานผลความก้าวหน้าของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และรายงานสถานภาพการชำระเงินค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ที่ยังไม่ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)

ตามที่อ้างถึง 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท ... จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) [โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 / โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT)] ซึ่งต่อมา กฟผ. ได้ออกประกาศที่อ้างถึง 2 ประกาศใช้งานระบบรายงานผลความก้าวหน้าของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และรายงานสถานภาพการชำระเงินค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า สำหรับ SPP ที่ยังไม่ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. กับ SPP ก่อน COD นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งความประสงค์ใช้งานระบบรายงานผลความก้าวหน้าของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และรายงานสถานภาพการชำระเงินค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ผ่านเว็บไซต์ <http://www.spp.egat.co.th/progressreport/> และขอมอบหมายผู้ใช้งาน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	หมายเลขโทรศัพท์	อีเมล	หมายเหตุ
			ขอใช้งานระบบ Electronic Declaration System (EDS)
			[]
			[]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

Contact Us

กองเจรจาจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสารสนเทศ
ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- ผู้ดูแลระบบ: นายพิทยุต์ม์ ปิรมย์จิตต์ วิศวกรระดับ 6
Tel: 0-2436-2818
Email: pittayut.piromjit@egat.co.th

